

26埼玉県立大学体育館棟 アリーナ天井改修工事

公立大学法人 埼玉県立大学

株式会社 山本理顕設計工場

図面リスト

図面タイトル	図面 N.O
表紙	—
図面リスト	—
特記仕様書	A-01
案内・配置図	A-02
1階平面図及び改修概要	A-03
2階平面図	A-04
3階平面図 (キャットウォークレベル)	A-05
4階平面図 (キャットウォークレベル)	A-06
R階平面図 (屋根トラス内)	A-07
体育館棟 立面図	A-08
体育館棟 断面図	A-09
1・2階 養生 (足場) 計画図 (参考)	A-10
仕上げ表・アリーナ部R階 (トラス内) 平面図	A-11
アリーナ部天井改修伏せ図	A-12
点検口、ダクト吊りボルト部ボード割付図	A-13
天井下地、ボードビス割付詳細図	A-14
アリーナ部天井断面詳細図	A-15
アリーナ部天井足場計画図 (参考)	A-16
アリーナ部天井設備プロット図 (参考)	A-17
電気天井改修図	E-01

26 埼玉県立大学体育館棟アリーナ天井改修工事 特記仕様書 別紙



<学内立入禁止日等>

1. 2026 年度学内立入禁止日（作業不可日）について ※入試等予備日★を含む
 - ・ 下記の日が入試や学内行事等により立入禁止（作業不可）となるので注意すること。
8 月 1 日(土)、8 月 2 日(日)、9 月 5 日(土)、★9 月 6 日(日)、9 月 13 日(土)、
10 月 23 日(金)、10 月 24 日(土)、10 月 25 日(日)、11 月 22 日(日)、★11 月 29 日(日)、
1 月 16 日(土)、1 月 17 日(日)、★1 月 23 日(土)、★1 月 24 日(日)、2 月 25 日(木)、
★2 月 26 日(金)、2 月 28 日(日)、★3 月 1 日(月)、3 月 15 日(月)

2. 施工期間中の注意点について
 - ・ 工事の施工は、騒音及び振動等で授業へ影響が出ないように考慮すること。
 - ・ 体育館のアリーナ以外の室（トレーニング室、ダンス室、管理室、器具庫等）は、原則として学生・教職員等の使用者が利用可能にすること。
 - ・ 各室内の作業については、使用者との調整に時間を要するため、作業実施の 2 週間前までに実施予定日を監督員へ連絡すること。

3. 施工時期の指定について
特記仕様書（図面 A-01）I-5. 工期 に記載のとおり、
 - ・ アリーナ半面（南側）での施工は 1 月 9 日から、
全面での施工は 2 月 1 日から契約工期までとする。
 - ・ 3 月 12 日(金)から 3 月 15 日(月)まで、アリーナでの卒業式イベント及び準備のため、
学校でアリーナを使用する。

※その他、大学の授業・行事等への影響も考慮に入れて工事計画を立てること。

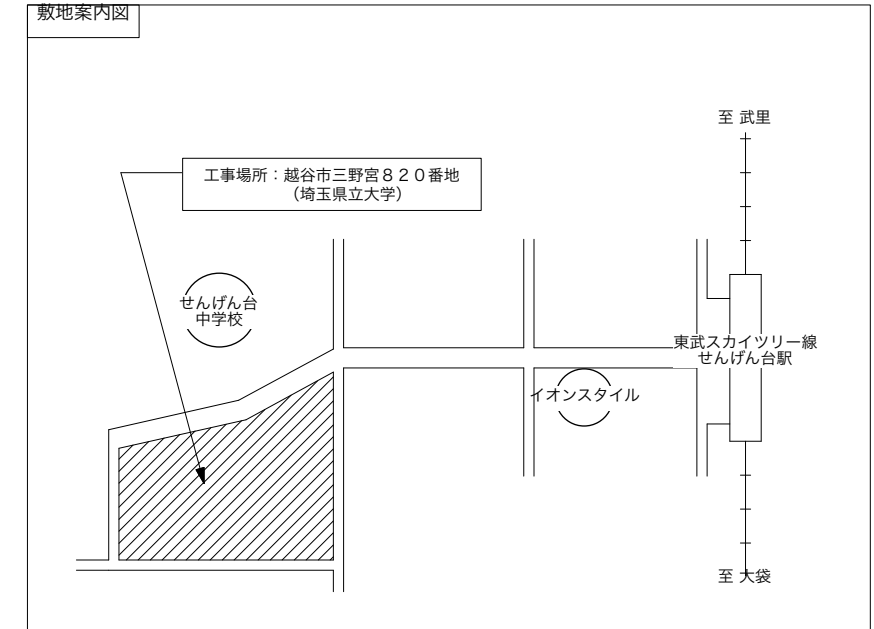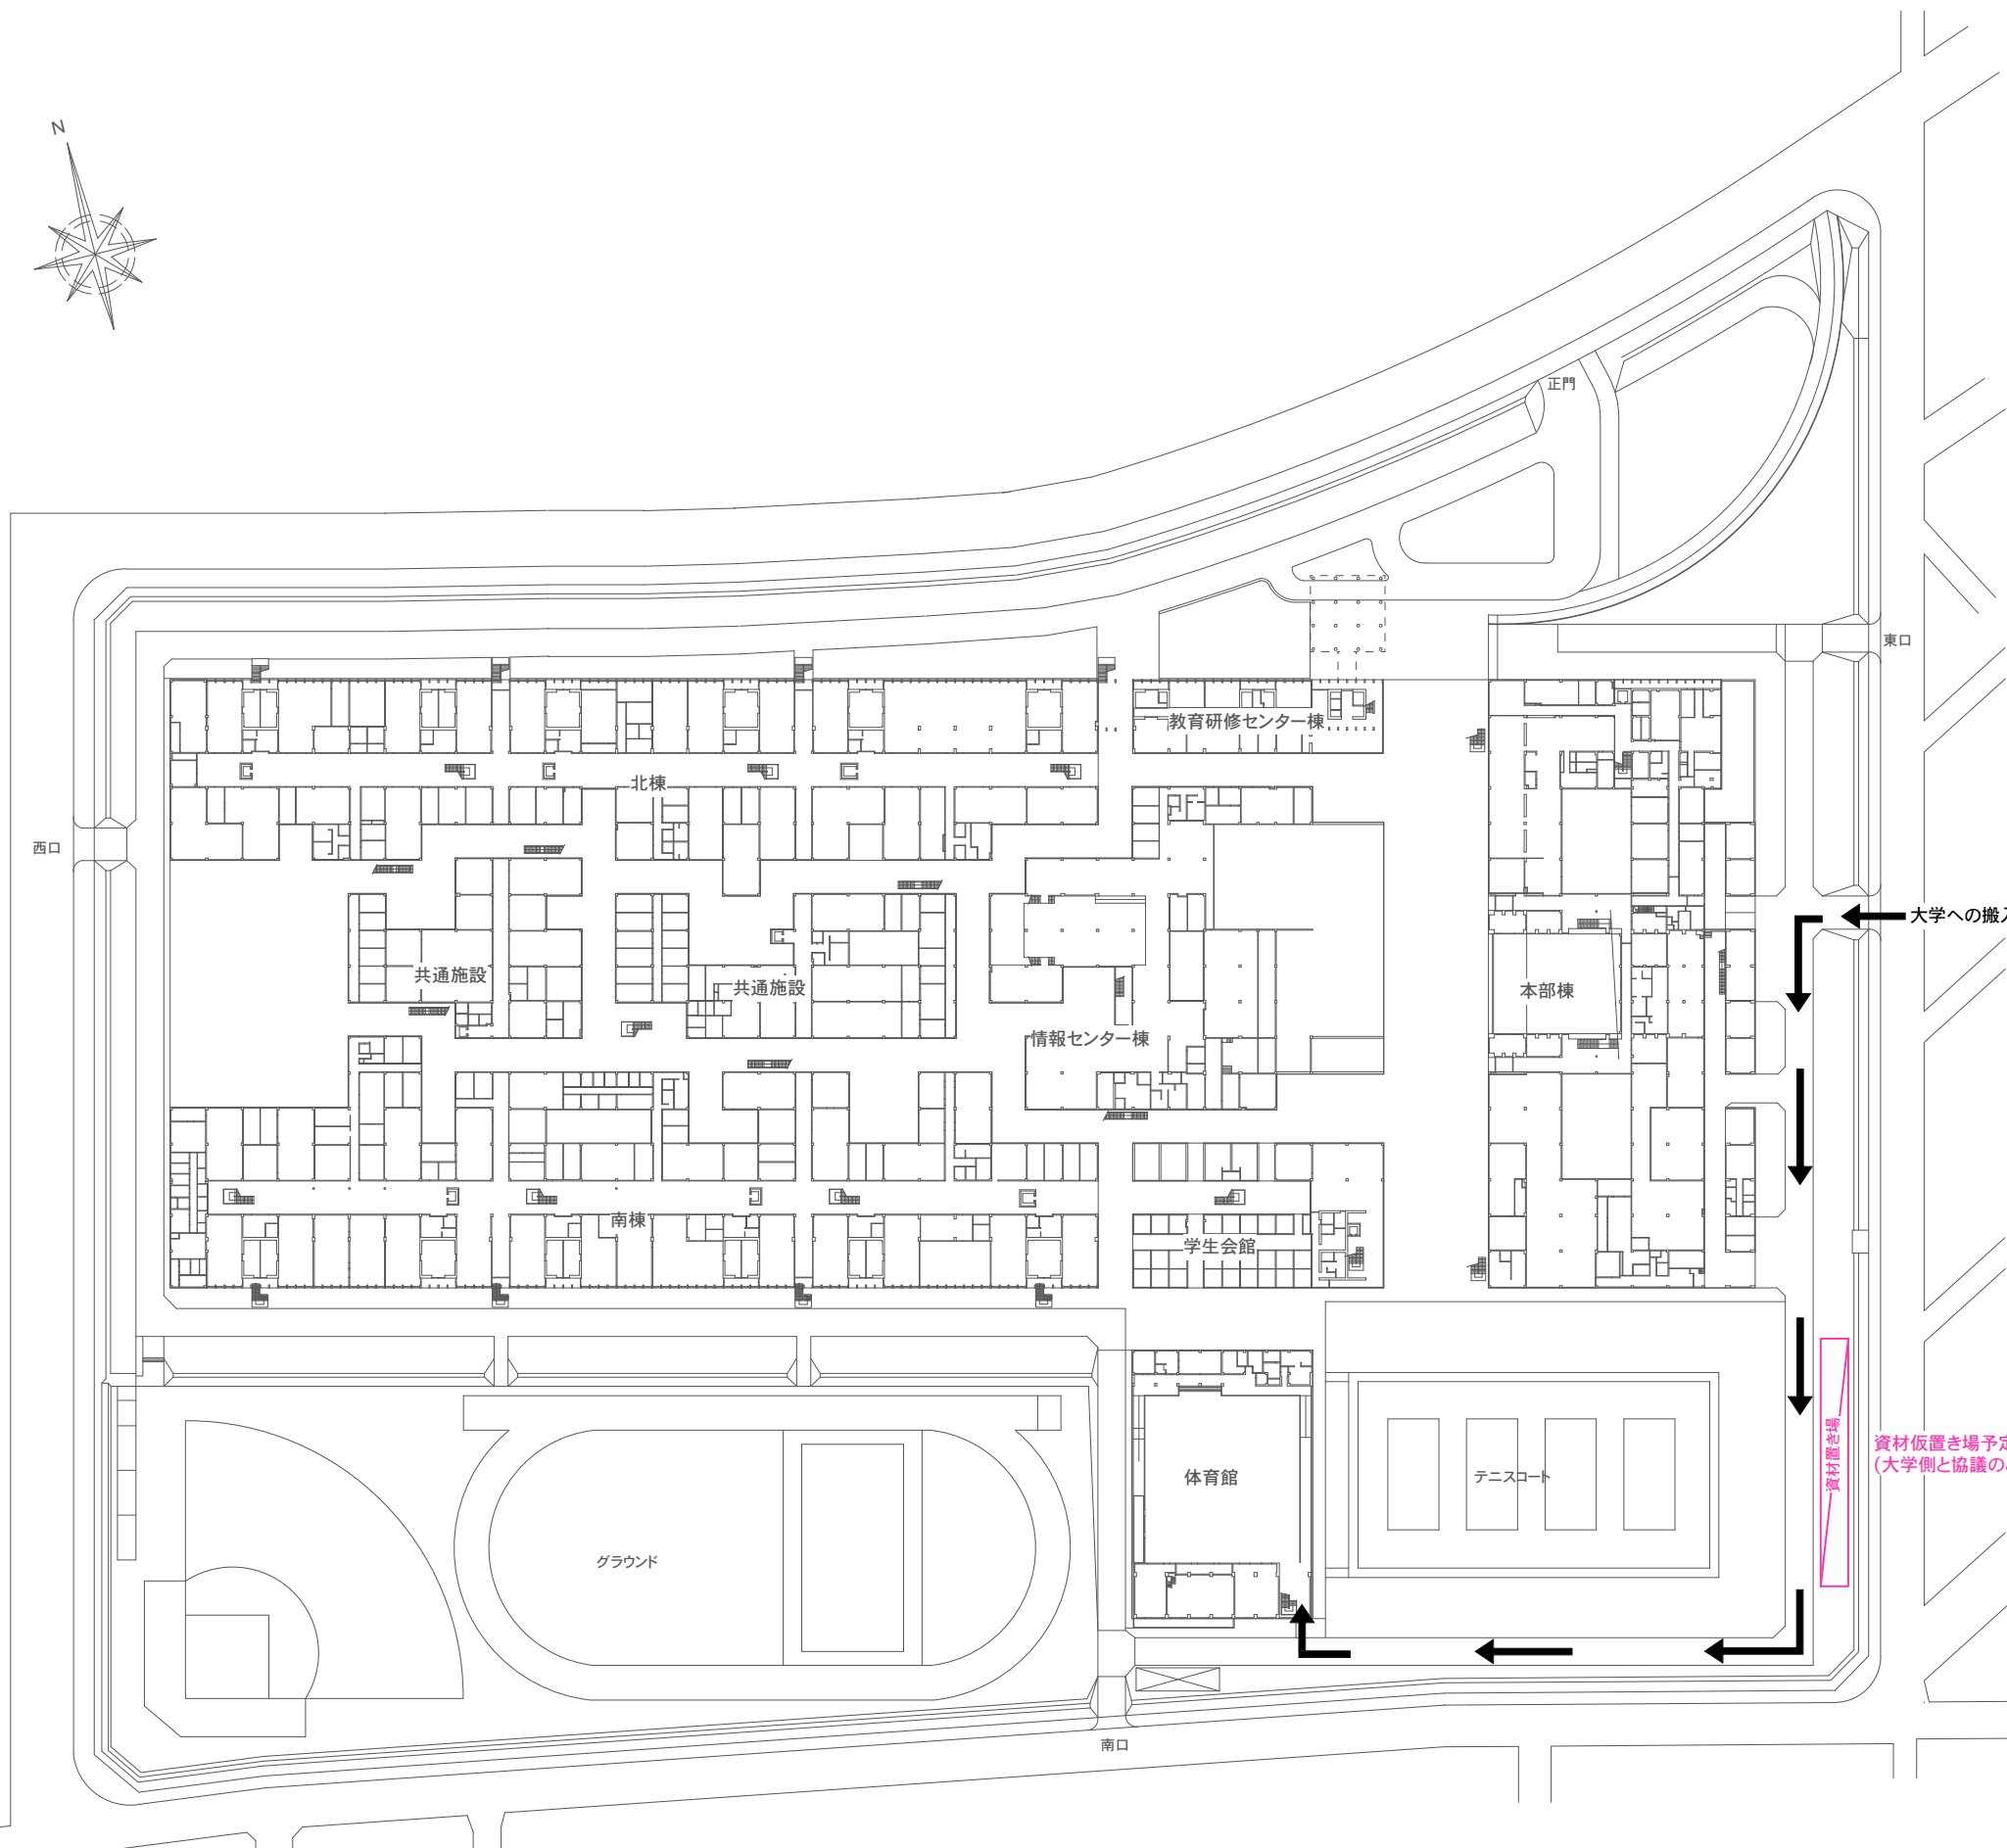

大学への搬入口はこのみ

資材置き場予定地
(大学側と協議のこと)

<凡例>

← 搬入路及び搬入経路を示す

1) 搬入路には必要に応じ交通警備員を配置すること。
2) 各工事部分に直接資材等を搬入する場合は大学側と協議すること。

<仮設計画注意事項>

- ・ 工事車両の進入に際しては大学側と十分に協議をし出入り口を決定すること
- ・ 工事車両は事前に入出りする台数、駐車位置等を施設管理者に随時確認し決定すること。
- ・ 仮設の設置等により敷地内の舗装面に穴あけ等の破損が生じた場合、現況復旧すること。
- ・ 必要に応じて交通誘導員を配置し、施設利用者の安全対策を十分に行うこと。
- ・ 仮設計画の図中の寸法は参考数値とし、工事段階で発生が予想される誤差を考慮すること。
- ・ 工事車両用駐車スペースについては大学と協議すること。

配置図 S=1/800




公立大学法人
埼玉県立大学

局長	副局長	部長	課長	担当

project title	26埼玉県立大学体育館棟アリーナ天井改修工事		title	案内図・配置図	
check	.	.	memo	scale	A1:1/800 A3:1/1600
株式会社 山本理顕設計工場 〒221-0843 横浜市新横浜区松ヶ丘37-1 PHONE 045-548-8400 一級建築士事務所 神奈川県知事登録 第8975号 一級建築士 山本理顕 大臣登録 第129567号			date	2026.03.12	no

date	2026.03.12	no	A-02
------	------------	----	------

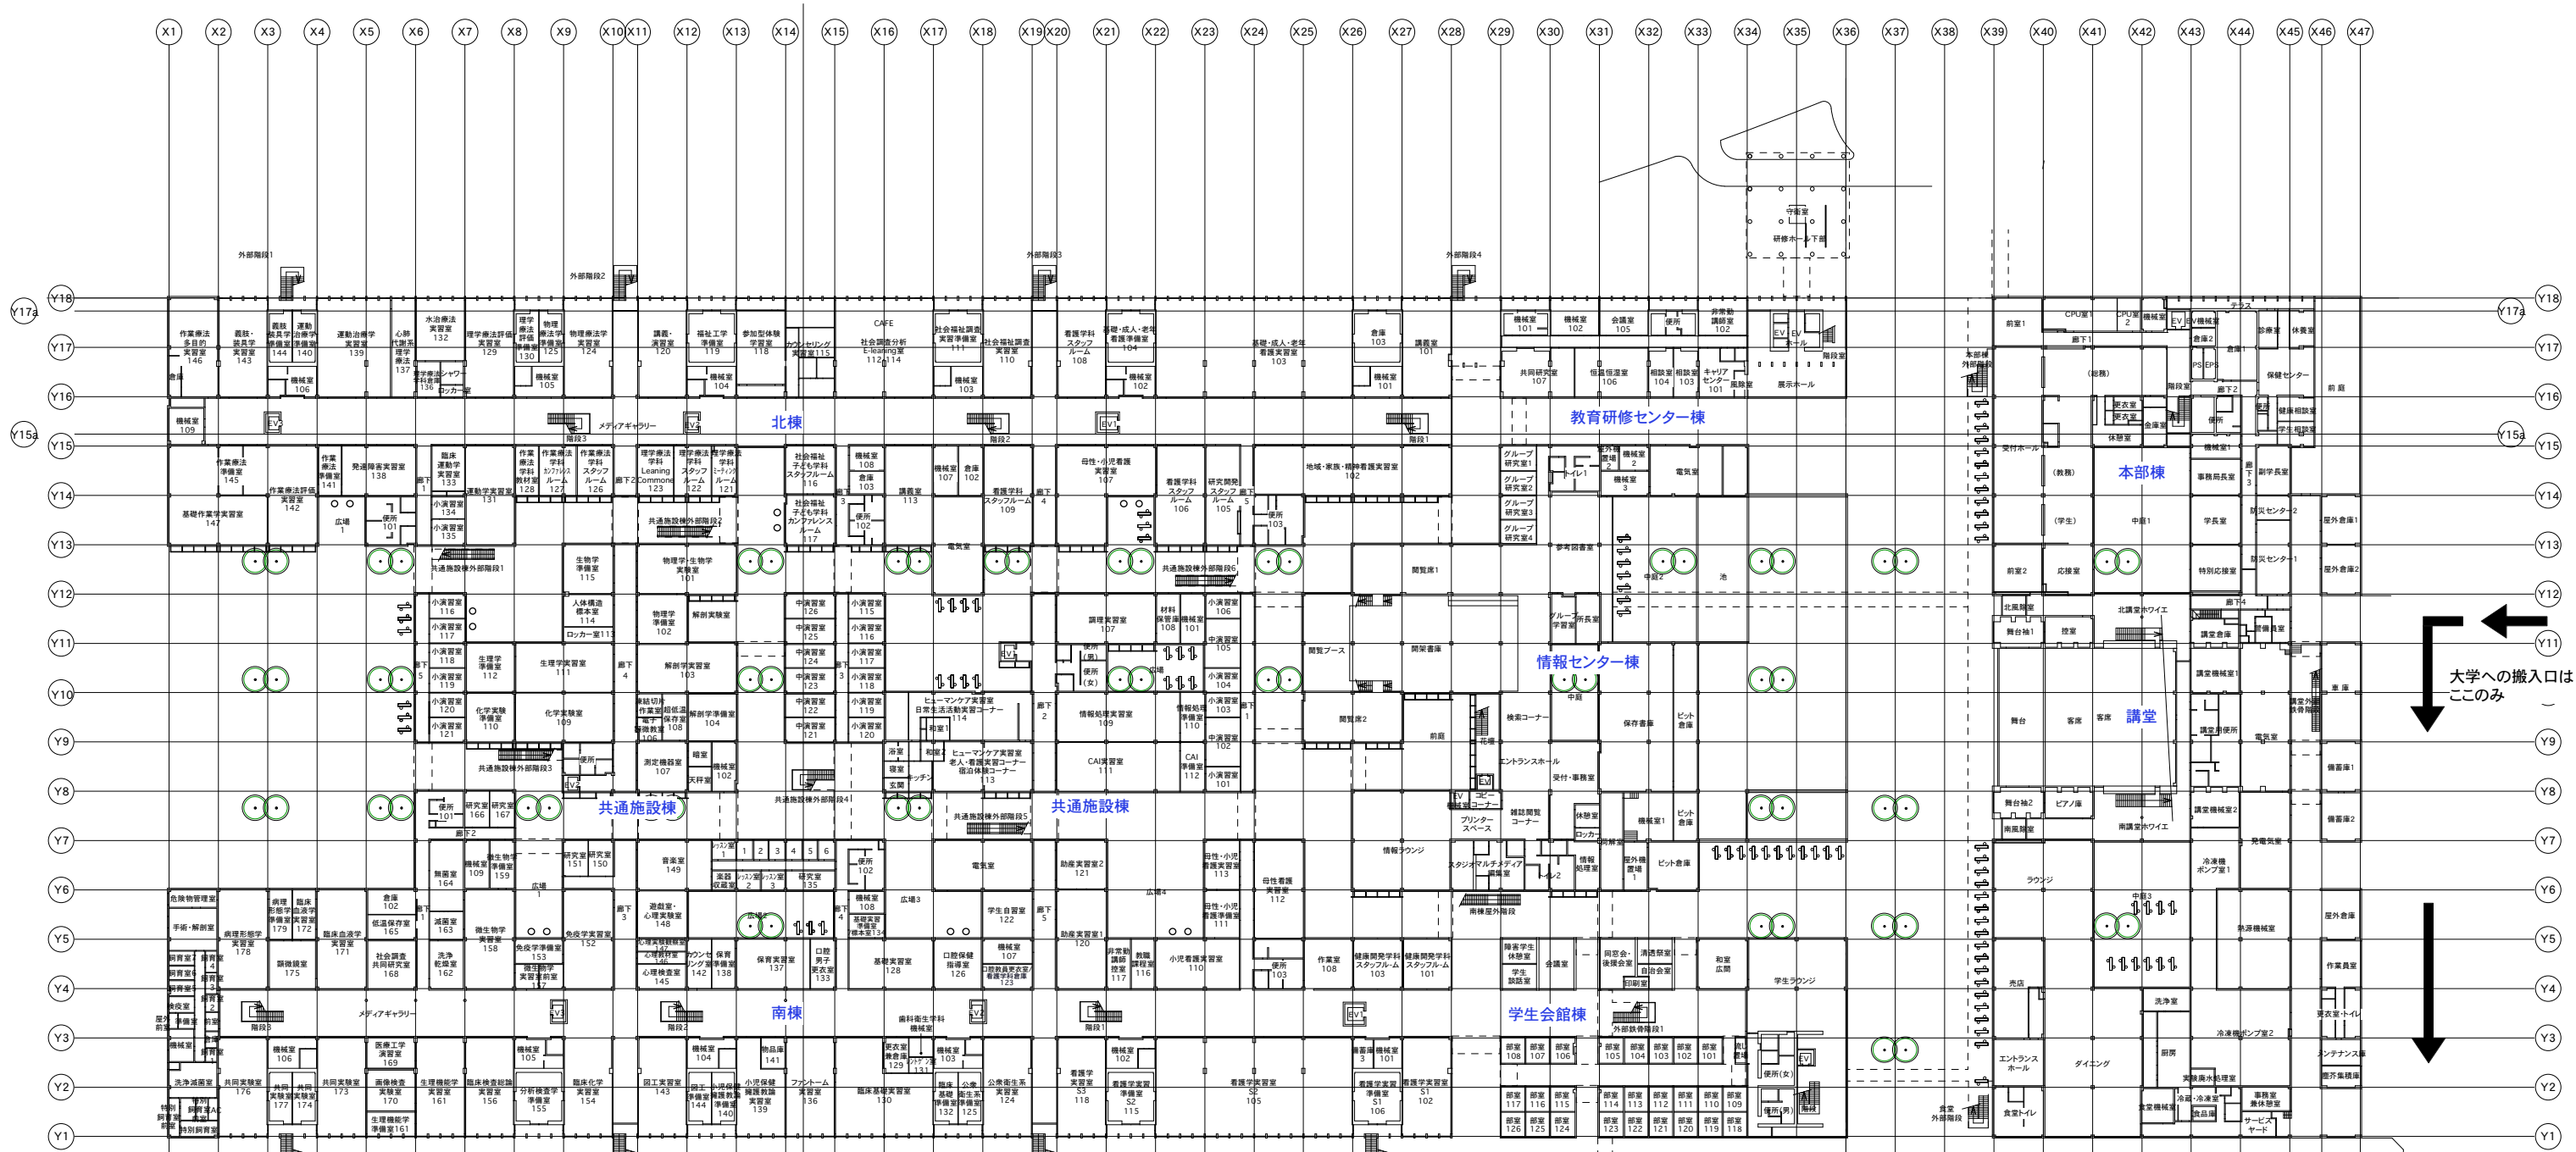

改修工事概要 (数量等は詳細図による)


棟名	室名	部位	改修内容
体育館棟	アリーナ	天井面	ボート張替え (EP-G塗装)

仕上げ表:改修前(既存)

棟名	室名	天井	
		下地	仕上げ(撤去)
体育館棟	アリーナ	LGS下地 グラスウール(t100)	有孔ケイカル板(t8)、EP、ガラスクロス裏打ち ケイカル板(t8)、EP 目透かし工法 石綿含有成形板(レベル3)

仕上げ表:改修後(新設)


棟名	室名	天井	
		下地	仕上げ
体育館棟	アリーナ	LGS下地(調整の上既存利用) グラスウール(t100)(調整の上既存利用) 一部Mバー、目地板新設	有孔ケイカル板(t8)、EP-G、ガラスクロス裏打ち(厚手) ケイカル板(t8)、EP-G 目透かし工法、一部継目処理工法あり

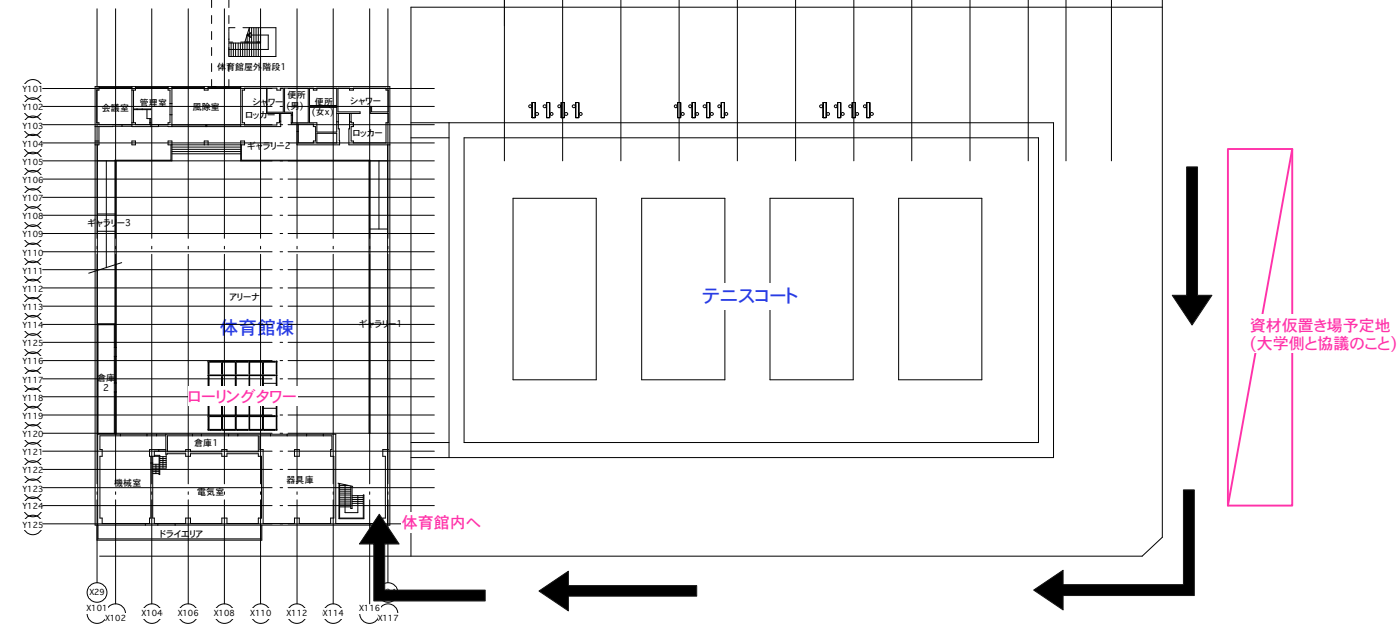

公立大学法人
埼玉県立大学


局長	副局長	部長	課長	担当

project title	title
26埼玉県立大学体育館棟アリーナ天井改修工事	1階平面図及び改修概要
check	scale A1:1/500 A3:1/1000
memo	date 2026.03.12 no A-03
株式会社 山本理髪設計工場 〒221-0843 横浜市神奈川区松ヶ丘37-1 PHONE 045-548-8400 一級建築士事務所 神奈川県知事登録 第8975号 一級建築士 山本理髪 大臣登録 第129567号	

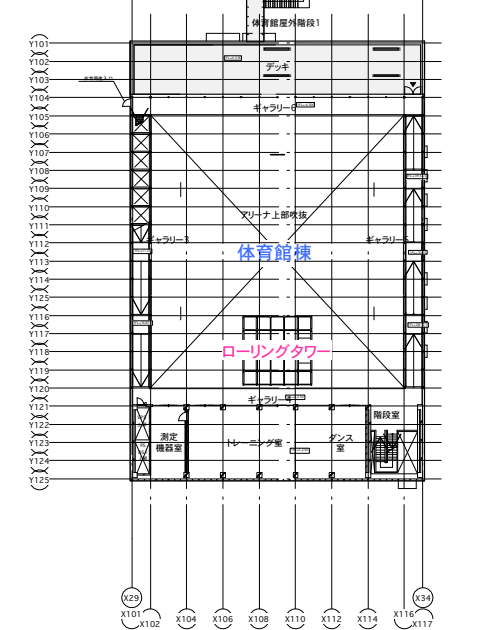

公立大学法人 埼玉県立大学		局長	副局長	部長	課長	担当
------------------	--	----	-----	----	----	----

project title	26埼玉県立大学体育館棟アリーナ天井改修工事			title	2階平面図		
check	memo			scale	A1:1/500	date	no
株式会社 山本理頭設計工場 〒221-0843 横浜市神奈川区根ヶ丘37-1 PHONE 045-548-8400 一級建築士事務所 神奈川県知事登録 第8975号 一級建築士 山本理頭 大臣登録 第129567号				A3:1/1000		2026.03.12	A-04

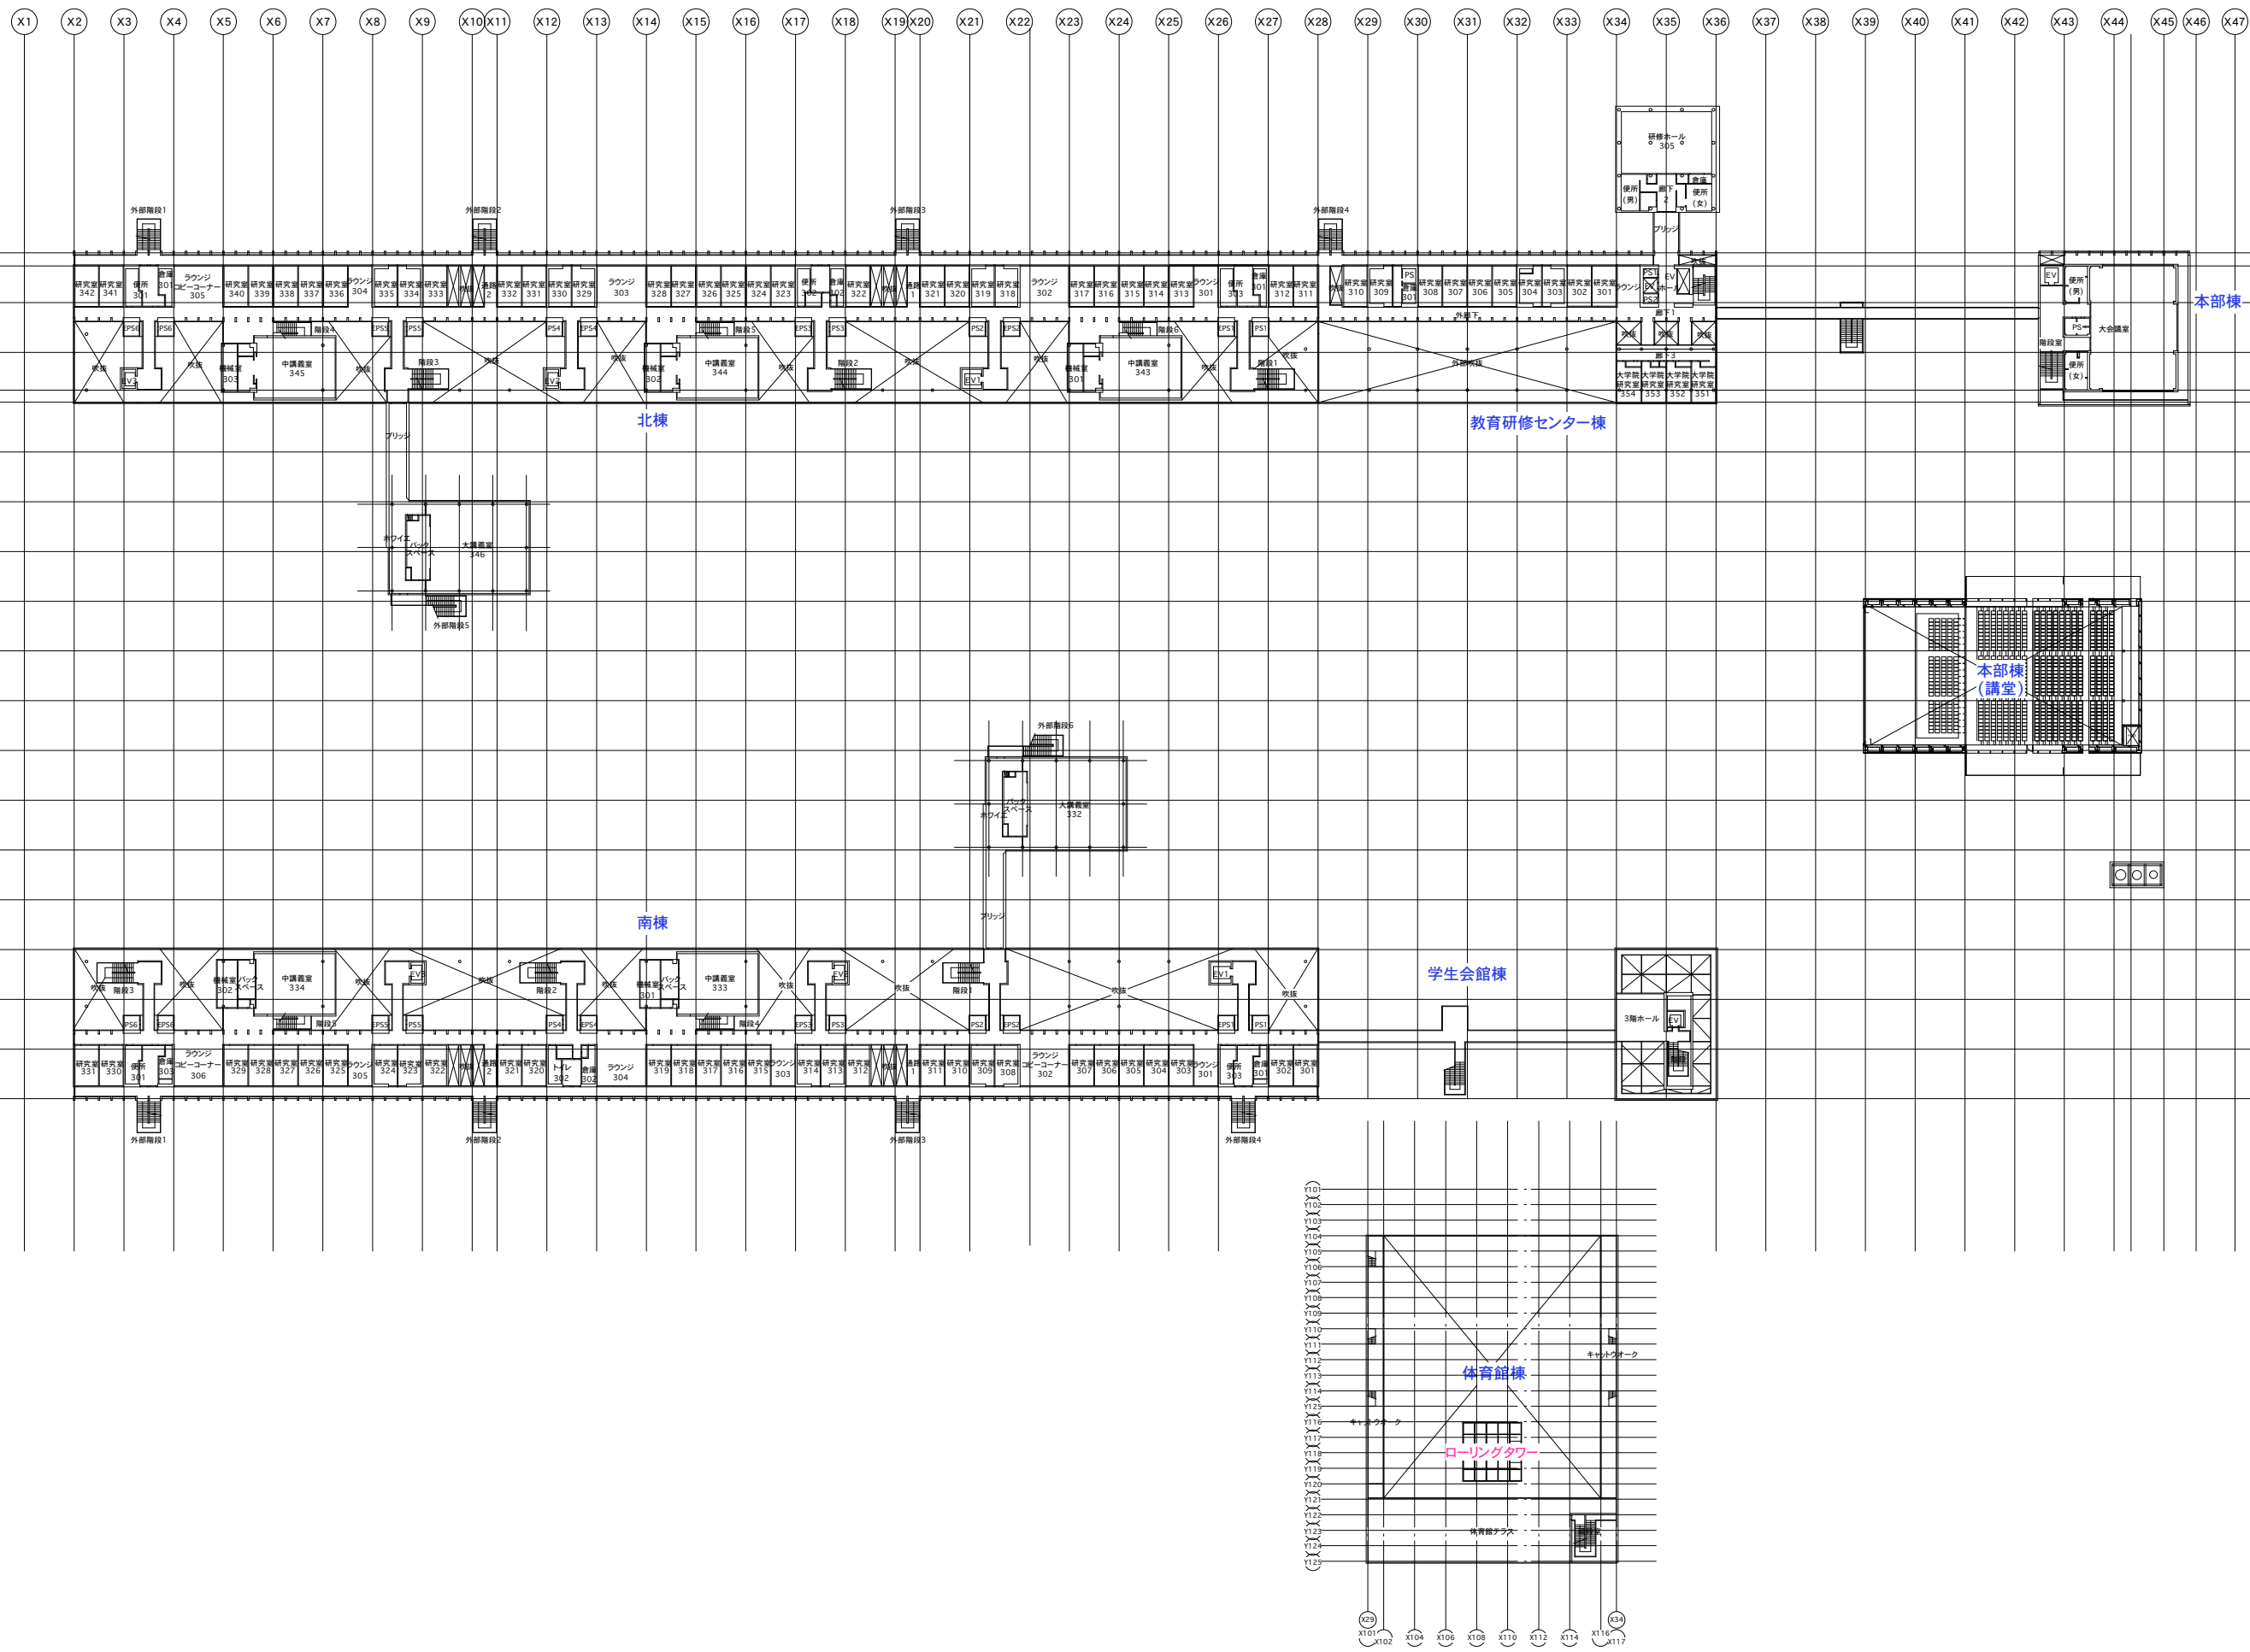



公立大学法人
埼玉県立大学

局長	副局長	部長	課長	担当

project title	26埼玉県立大学体育館棟アリーナ天井改修工事			title	3階平面図(キョウトワークバル)					
check	.	.	.	memo	scale	A1:1/500 A3:1/1000	date	2026.03.12	no	A-05

株式会社 山本建築設計工場 〒221-0843 横浜市神奈川区松ヶ丘37-1 PHONE 045-548-8400 一級建築士事務所 神奈川県知事登録 第8975号 一級建築士 山本理顕 大臣登録 第129567号



X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X39 X40 X41 X42 X43 X44 X45 X46 X47

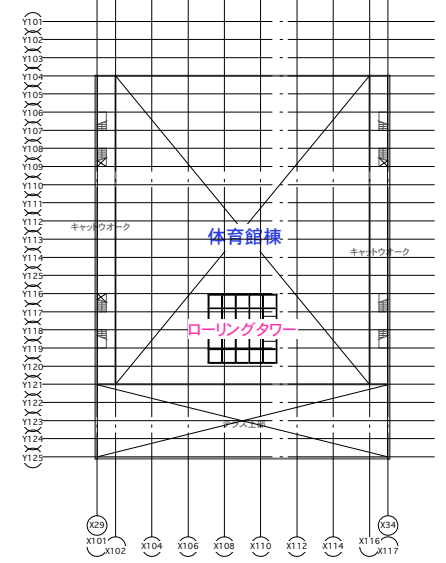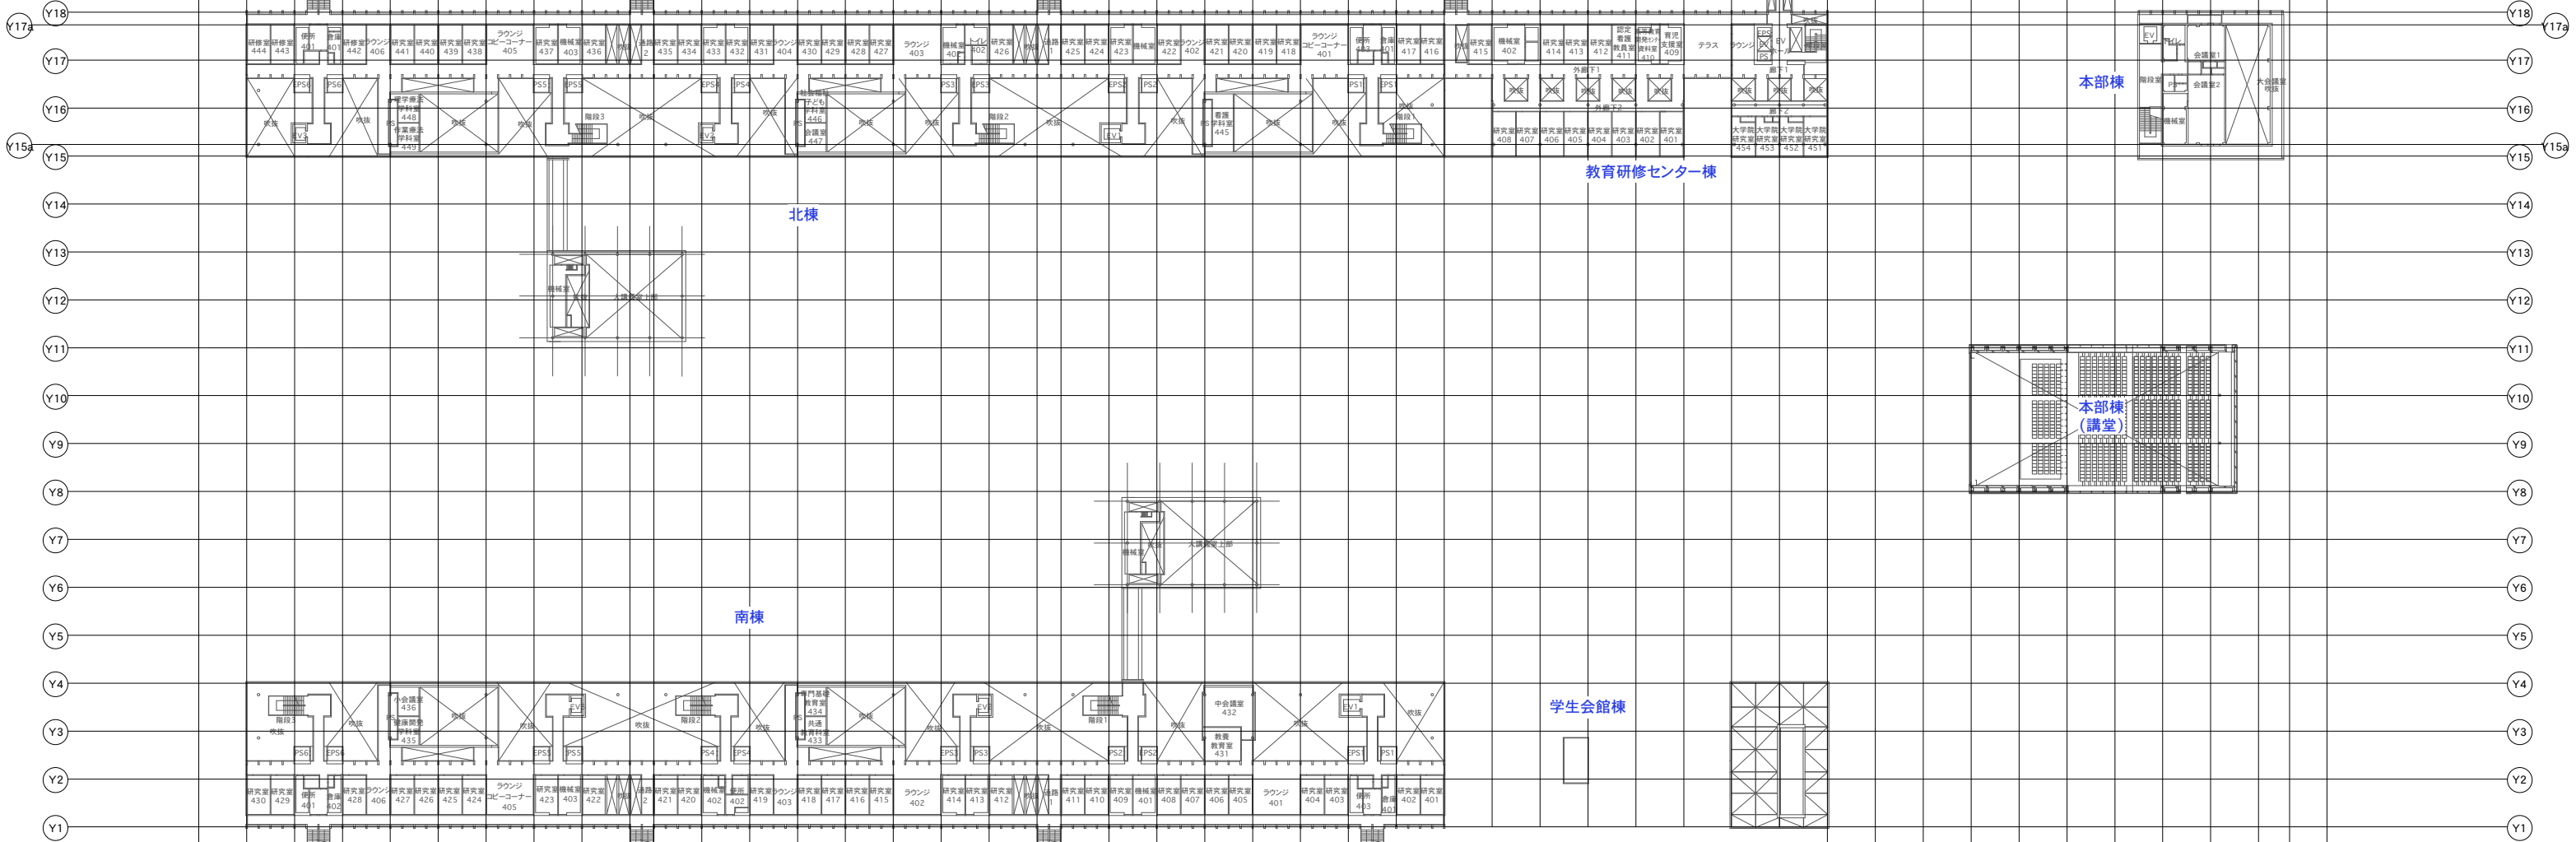

公立大学法人
埼玉県立大学

局長	副局長	部長	課長	担当

project title	26埼玉県立大学体育館棟アリーナ天井改修工事			title	4階平面図(キャットウォーク)					
check	.	.	.	memo	scale	A1:1/500 A3:1/1000	date	2026.03.12	no	A-06
株式会社 山本理顕設計工場 〒221-0843 横浜市神奈川区松ヶ丘37-1 PHONE 045-548-8400 一級建築士事務所 神奈川県知事登録 第8975号 一級建築士 山本理顕 大臣登録 第129567号										

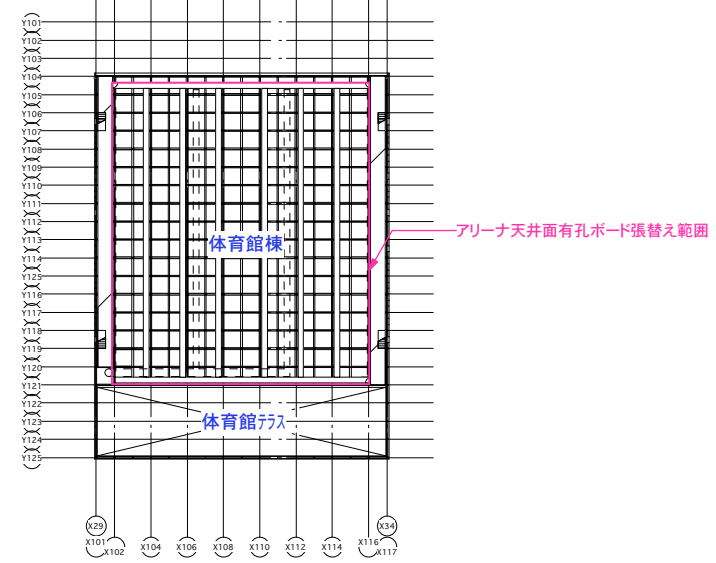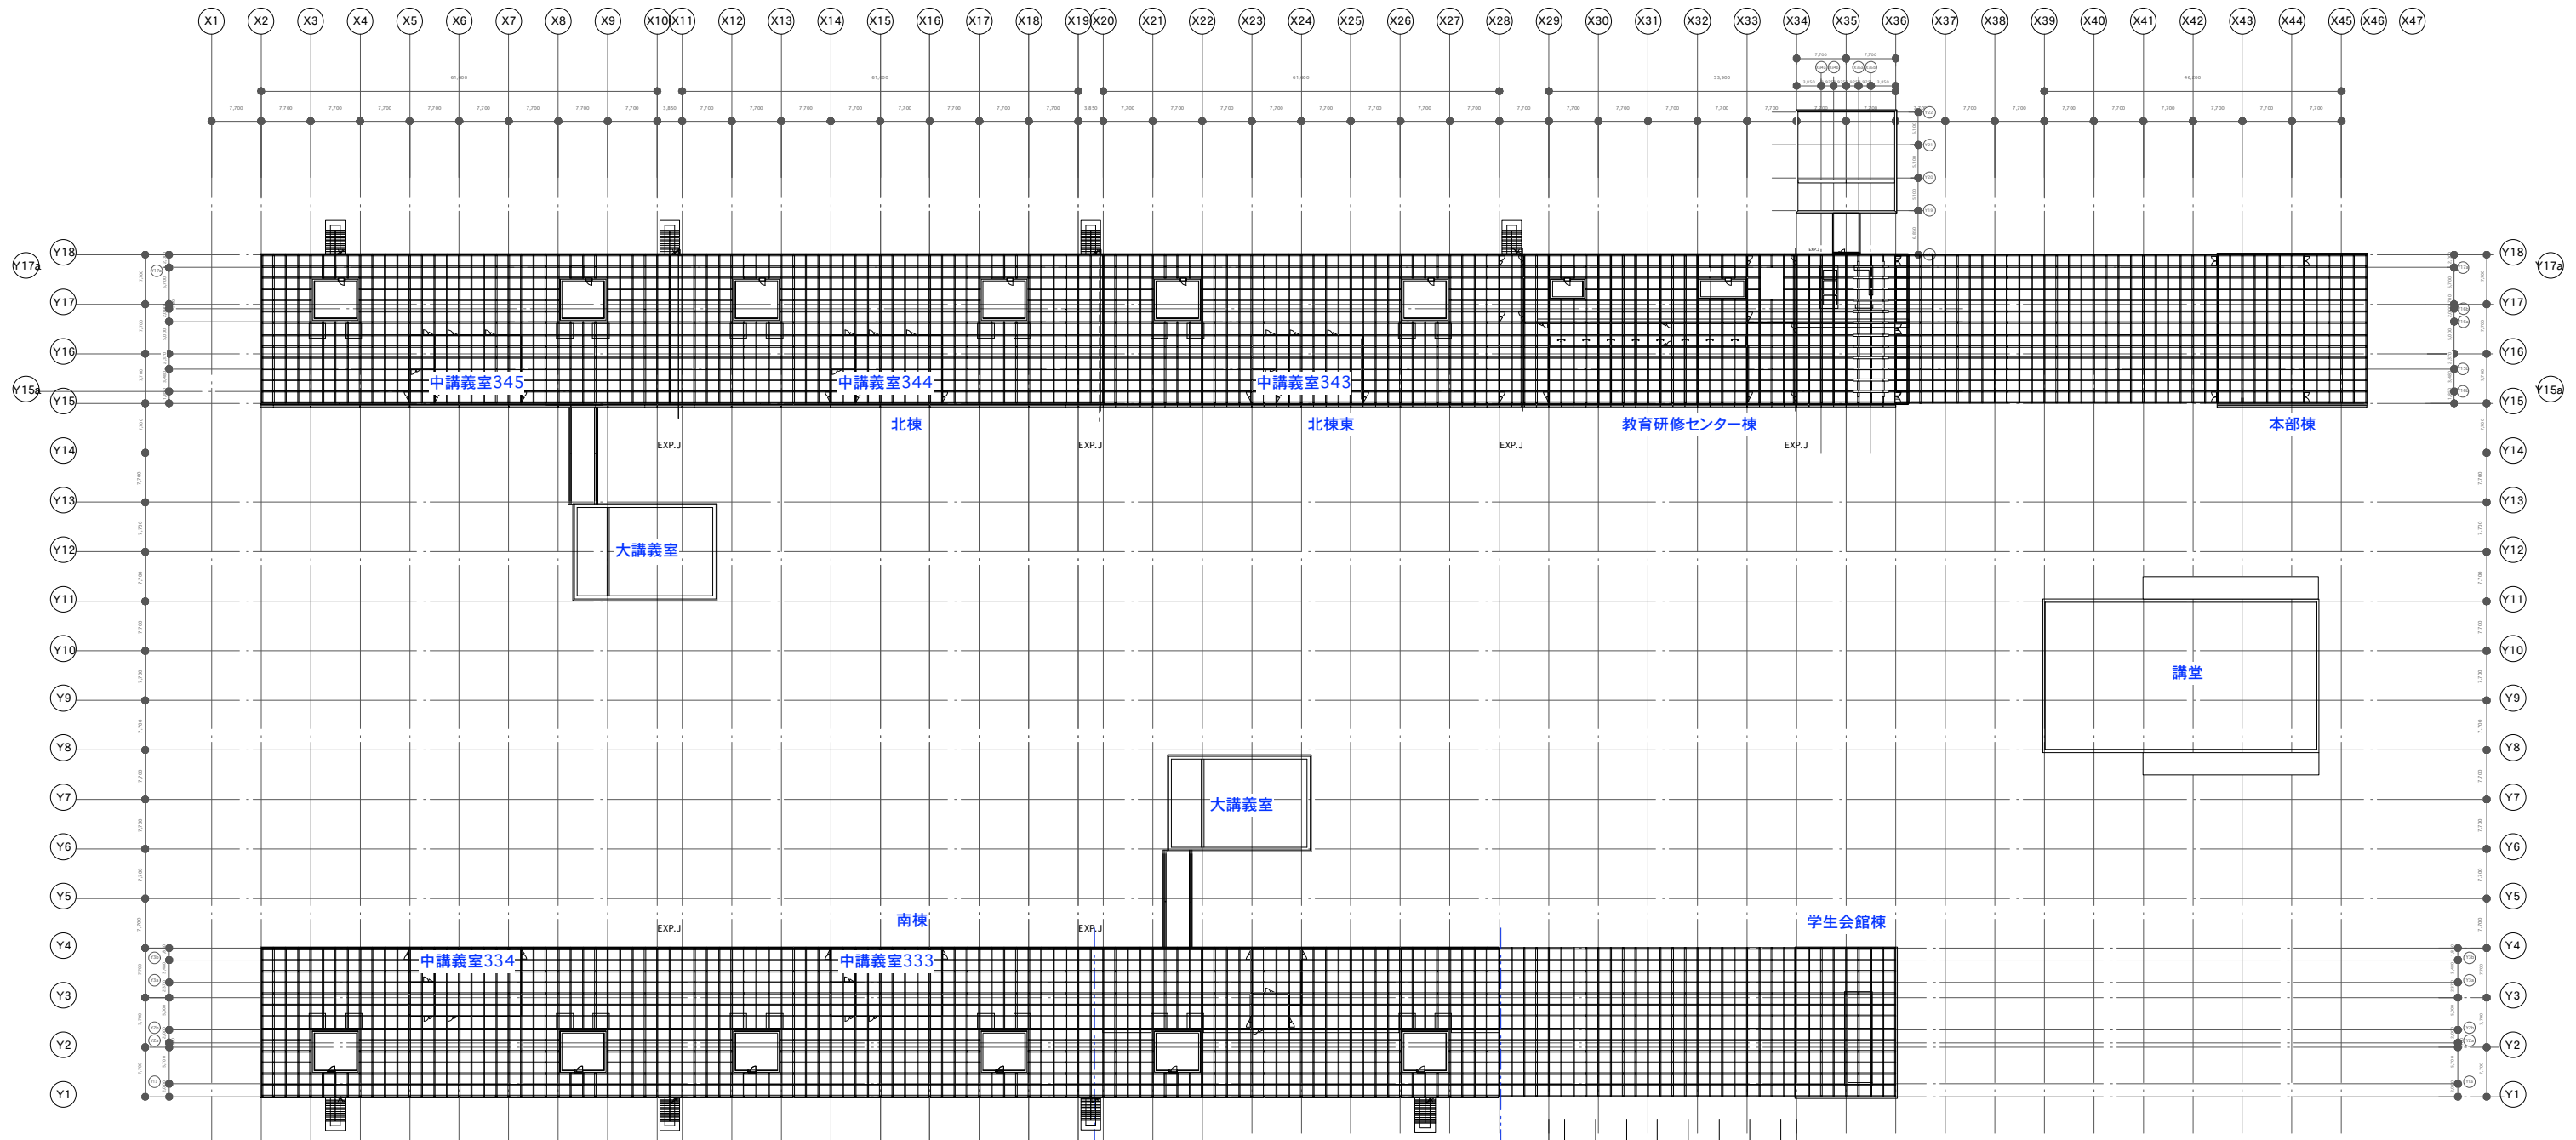

公立大学法人
埼玉県立大学

局長	副局長	部長	課長	担当

project title	26埼玉県立大学体育館棟アリーナ天井改修工事			title	R階平面図(屋根トラス内)		
check		memo		scale	A1:1/500 A3:1/1000	date	2026.03.12
株式会社 山本理観設計工場 〒221-0843 横浜市神奈川区松ヶ丘37-1 PHONE 045-548-8400 一級建築士事務所 神奈川県知事登録 第8975号 一級建築士 山本理観 大匠登録 第129567号				no	A-07		

